



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

Procedimento Licitatório nº 439/2021

Contrato nº 01/2022.

Objeto: Execução de obras de construção e instalação, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, do dique de contenção de hipoclorito de sódio da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Camanducaia no município de Jaguariúna – Contrato de Financiamento nº 0529.795-19 – operação de crédito autorizada pela Lei Municipal nº 2.646/2.019 – FINISA.

EMPRESA CONTRATADA: TEMASA – TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

CONTRATO ASSINADO em: 04-de janeiro de 2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ETE Camanducaia, localizada na Rua Hilda David Dal’Bó, 501 – Bairro Guedes, no Município de Jaguariúna/SP.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 10 de Janeiro de 2022.

DECLARAÇÃO:

Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório através deste Recebimento Provisório da obra, passando a contar a partir desta data o prazo de 15 (quinze) dias corridos, destinados a eliminação das pendências apontadas abaixo bem como o período de observação de mais 15 (quinze) dias corridos, ficando claro que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se observe que os mesmos não se encontram de acordo com o objeto. Após o prazo corrido de 30 (trinta) dias a partir desta data, não persistindo quaisquer pendências, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.


Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei nº 8.666/93.

Pendências Apontadas: HÁ conforme descrição a seguir.

- Corrigir o vazamento na parte inferior próximo da caixa de sucção do dique e realização de teste de estanqueidade por 24h;



- Corrigir o acabamento dos guarda-corpos;

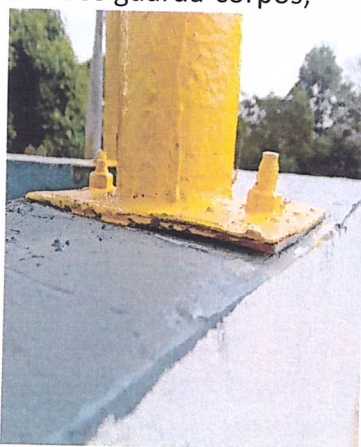

- Corrigir o acabamento da escada de alvenaria;




- Corrigir a pintura do dique.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

- Instalar a régua permanente de indicação de nível com subindicação a cada 100L, a atual não é permanente, está com escala muito grande (a cada 1.000L), e já saindo.

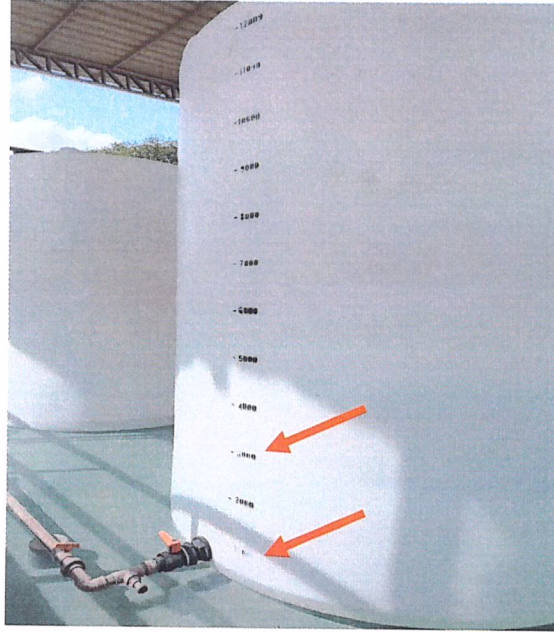

- Devolução para o Depto. de Tratamento de Esgoto dos registros e conexões utilizados de 2" de hipoclorito de sódio utilizados quando rompeu os originais.



- Instalação da grade do sistema de emergência da área de transferência de hipoclorito.



Jaguariúna, 05 de Agosto de 2022.

Fiscalização Portaria nº 069 de 11/01/2022:
Eng^a Maria Teresa de Toledo Lima

Fiscalização Portaria nº 069 de 11/01/2022
Silvana Turolla Broleze

Contratada: **TEMASA – TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA**
Eng^o Laudinor Gonçalves da Silva
CREA nº 5060554
